Raision kaupunki
Päällikkö: Tekninen lautakunta **Suunnittelija: JS**

TILAPALVELUJEN VUODEN 2017 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.6.2017

No	Numero	Työkohteen nimi	Selite	Talousarvio 17	Tot. menot	Tot. meno %	Vastuuhenkilö	Työvoima	Vast.ottaja/ Toteuttaja
1		**TILAPALVELUT YHTEENSÄ**		**5 500 000 €**	**2 481 816 €**	**45**			
1.1		**RAKENNUSHANKKEET**		**4 050 000 €**	**1 819 243 €**	**45**			
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu	50 000 €	46 289 €	93	Sulander		
1.1.2	4105	Kuninkojan paloasema	suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen	1 700 000 €	673 157 €	40	Sulander		Tela / urakka
1.1.3	4406	Kauppaoppilaitoksen perusparannus	ulkovaipan perusparannuksen aloittaminen	800 000 €	484 359 €	61	Sulander		Tela / urakka
1.1.4	4705	Kerttulan liikuntahallin perusparannus	perusparannuksen jatkaminen	1 500 000 €	615 438 €	41	Sulander		Tela / urakka
1.2	**5010**	**MUUT PERUSKORJAUKSET**		**1 350 000 €**	**649 608 €**	**48**			
1.2.1	965010	Muut peruskorjaukset	suunnittelu ja rakentaminen, sisäilmaongelmakohteiden korjauksia	90 000 €	87 364 €	97	Jalonen		Teke / oma työ
1.2.2	965101	Kaupungintalo	valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uusiminen, jätekatoksen hankinta	85 000 €	15 120 €	18	Vasama	1	Teke / urakka
1.2.3	965207	Terveysasema	ulko-ovien ja väliovien uusiminen	10 000 €	1 718 €	17	Jalonen	2	Teke / oma työ
1.2.4	965210	Terveyskeskuksen vuodeosasto 3 krs	sisäovien vaihto, sisäpuolisia korjauksia	12 000 €	21 072 €	176	Jalonen	1	Teke / oma työ
1.2.5	965306	Hakinmäen päiväkoti	ulko- ja sisäpuolisia korjauksia	15 000 €	8 676 €	58	Lehtinen	2	Teke / oma työ
1.2.6	965312	Metsäaron päiväkoti	kuraeteisen muutostyöt	35 000 €	739 €	2	Jalonen	2	Teke / oma työ
1.2.7	965313	Petäsmäen päiväkoti	kuraeteisen muutostyöt, keittiölaitteiden uusimisia	40 000 €			Lehtinen	2	Teke / oma työ
1.2.8	965315	Varppeen päiväkoti	ikkunoiden uusimisen jatkaminen, sisäpuolisia korjauksia	35 000 €	2 739 €	8	Lehtinen	2	Teke / urakka
1.2.9	965402	Friisilän koulu	IV-koneiden uusimisia, ikkunoiden uusimisen jatkaminen, sisäpuolisia korjauksia	400 000 €	138 173 €	35	Lehtinen	3	Teke / urakka
1.2.10	965404	Ihalan koulu	asuntolan putkiremontin jatkaminen	35 000 €	10 690 €	31	Vasama	2	Teke / urakka
1.2.11	965406	Kauppaoppilaitos	sisäpuolisia korjauksia, sisäpihan kunnostaminen	20 000 €	37 243 €	186	Jalonen	3	Teke / oma työ
1.2.12	965407	Kerttulan koulu	vanhan koulurakennuksen maalaus	30 000 €	10 478 €	35	Jalonen	2	Teke / urakka
1.2.13	965412	Tahvion koulu	koulurakennuksen maalaus	40 000 €	5 746 €	14	Lehtinen	3	Teke / urakka
1.2.14	965413	Vaisaaren koulu	kotitalousluokan peruskorjaus, kanslian siirto, kylmiöiden uusimisia	340 000 €	161 655 €	48	Jalonen	3	Teke / oma työ
1.2.15	965418	Kirjasto	ulko- ja sisäpuolisia korjauksia, lainausautomaatin tilan korjaus	15 000 €			Jalonen	2	Teke / oma työ
1.2.16	965601	Krookilan kotiseutukeskus	kesäteatterin katsomon rakentaminen	40 000 €	71 623 €	179	Lehtinen	2	Teke / oma työ
1.2.17	965706	Uimahalli	saunan lauteiden korjauksia, laatoituskorjauksia, ulkoverhousten korjauksia	55 000 €	974 €	2	Lehtinen	2	Teke / oma työ
1.2.18	965710	Raikulan kentän huoltorakennus	peruskorjauksen jatkaminen	15 000 €	46 585 €	311	Jalonen	2	Teke / oma työ
1.2.19	965903	Killin työkeskus	ulkopuoliset maalaukset	15 000 €	6 013 €	40	Lehtinen	2	Teke / oma työ
1.2.20	965916	Hulvelan palvelutalo	uunin uusiminen	23 000 €	23 000 €	100	Vasama	2	Teke / urakka
1.3	**7010**	**KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT**		**100 000 €**	**12 965 €**	**13**			
1.3.1	967010	Muut pihatyöt	suunnittelu ja rakentaminen	20 000 €	4 648 €	23	Korrento		Teke / oma työ
1.3.2	967306	Hakinmäen päiväkoti	jätekatoksen hankinta, pihan asfaltointia	15 000 €	8 317 €	55	Korrento	2	Teke / urakka
1.3.3	967312	Metsäaron päiväkoti	aidan rakentaminen	10 000 €			Korrento	2	Teke / urakka
1.3.4	967320	Leijapuiston päiväkoti	leikkikentän rakentaminen	10 000 €			Korrento	3	Teke / urakka
1.3.5	967402	Friisilän koulu	aidan rakentaminen, valaistuksen uusimisia	30 000 €			Korrento	3	Teke / urakka
1.3.6	967410	Kuloisten koulu	aidan rakentaminen, portaiden korjauksia	15 000 €			Korrento	2	Teke / urakka

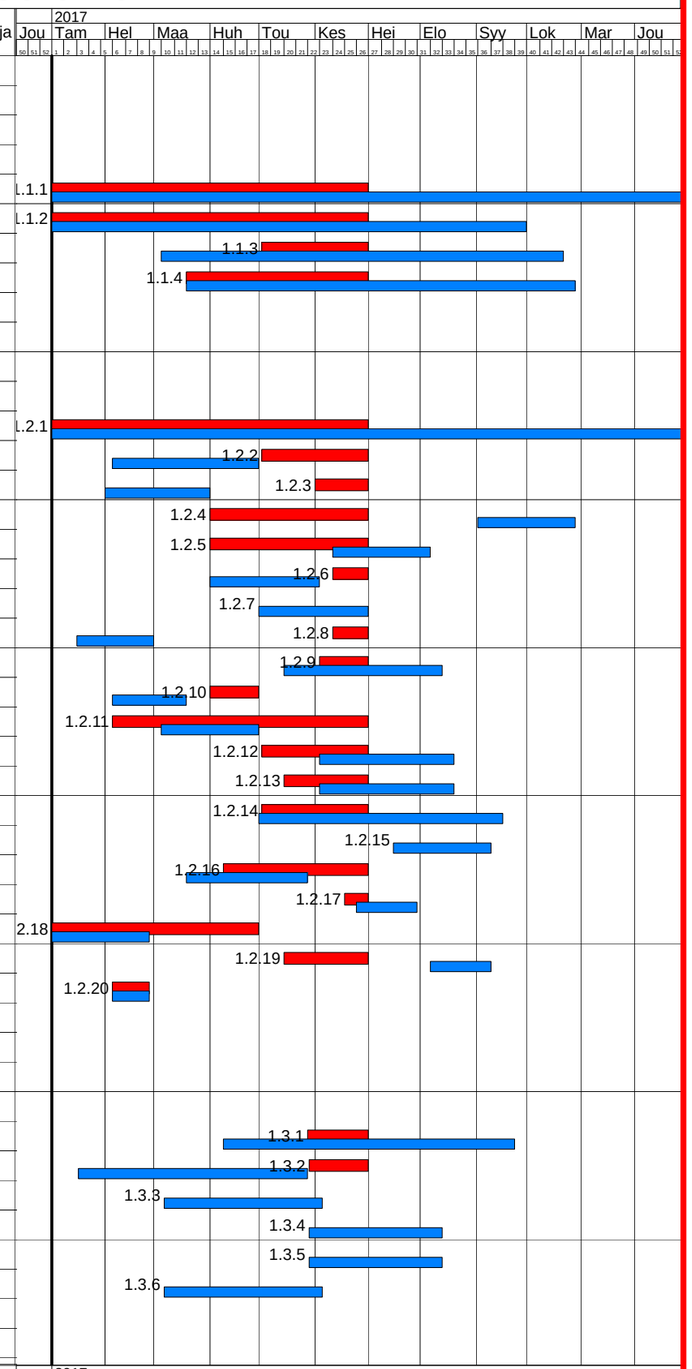

Selite	Kenttä	Viivatyyli	Tyyli
Menot kuukausittain	Talousarvio 17		
Menot kuukausittain	Tot. menot		

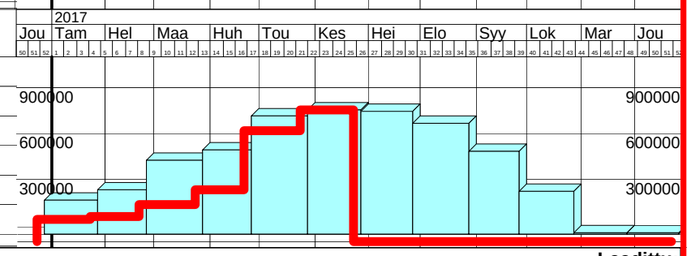

Raision kaupunki
Tekninen lautakunta

Suunnittelija: RJ

VUODEN 2017 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN TYÖOHJELMAN TOTEUTUMA 30.6.2017

Hierarkia	Kohde	Talousarvio 2017	Tot. menot	Tot. meno-%	Selitys
1	**KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN**	**4 395 000 €**	**1 160 421 €**	**26**	**KAIKKI YHTEENSÄ**
1.1	**SUUNNITTELU**	**580 000 €**	**158 384 €**	**27**	**Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset**
1.2	**URAKOITSIJA**	**200 000 €**	**11 001 €**	**6**	
1.2.1	Taitorakenteet	200 000 €	11 001 €	6	Kuloisten risteyssillan saneeraus
1.3	**URAKOITSIJA**	**350 000 €**	**88 438 €**	**25**	
1.3.1	Päällystystyöt	350 000 €	88 438 €	25	Uudelleen-/uudispäälystyksiä varten
1.4	**URAKOITSIJA**	**2 995 000 €**	**751 901 €**	**25**	
1.4.1	Telan erikseen päättämät	600 000 €	166 699 €	28	Tarkentuu TA-vuoden aikana
1.4.2	Teollisuusalueet	200 000 €	100 600 €	50	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen
1.4.3	Hulvelan pääte	180 000 €			Hulvelan päätteen kunnallistekniikan rakentamisen rahoitus
1.4.4	Katuvalaistus	265 000 €	40 615 €	15	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus
1.4.5	Kevyenliikenteen väylät	80 000 €	3 700 €	5	Kevyenliikenteen väylien perusparannus-/rakentamisraha
1.4.6	Liikennevalot	110 000 €			Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen
1.4.7	Liikenneturvallisuus	90 000 €	15 522 €	17	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha
1.4.8	Pumppaamoiden saneeraus	100 000 €	129 883 €	130	Vanhojen pumppaamoiden saneerausraha, Somersojan pumppaamo
1.4.9	Isojen ojien kunnostus	120 000 €			Järvenojan ja Piuhanojan kunnostus
1.4.10	Kantokangas	490 000 €	92 321 €	19	Pohjoisten alueiden katu- ja tonttitarjontaan varattu rakentamisraha
1.4.11	AO-tontit	260 000 €	159 873 €	61	Jermun alueen rakentamisraha
1.4.12	Hahdenniemen alueen kehittäminen	200 000 €	42 688 €	21	Hahdenniemen alueen kehittämisen aloitusrahoitus
1.4.13	MAL-hanke	300 000 €			Yhteishankkeisiin varattu rakentamisraha
1.5	**VIHERALUEET**	**270 000 €**	**150 697 €**	**56**	
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	20 000 €	14 155 €	71	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita
+1.5.2	Leikkikenttien rakentaminen ja peruskorjaus	100 000 €			Leikkikenttien peruskorjausraha
1.5.3	Venesatama	150 000 €	136 542 €	91	Venesataman kunnostustyöt, aallonmurtajalaiturin peruskorjaus

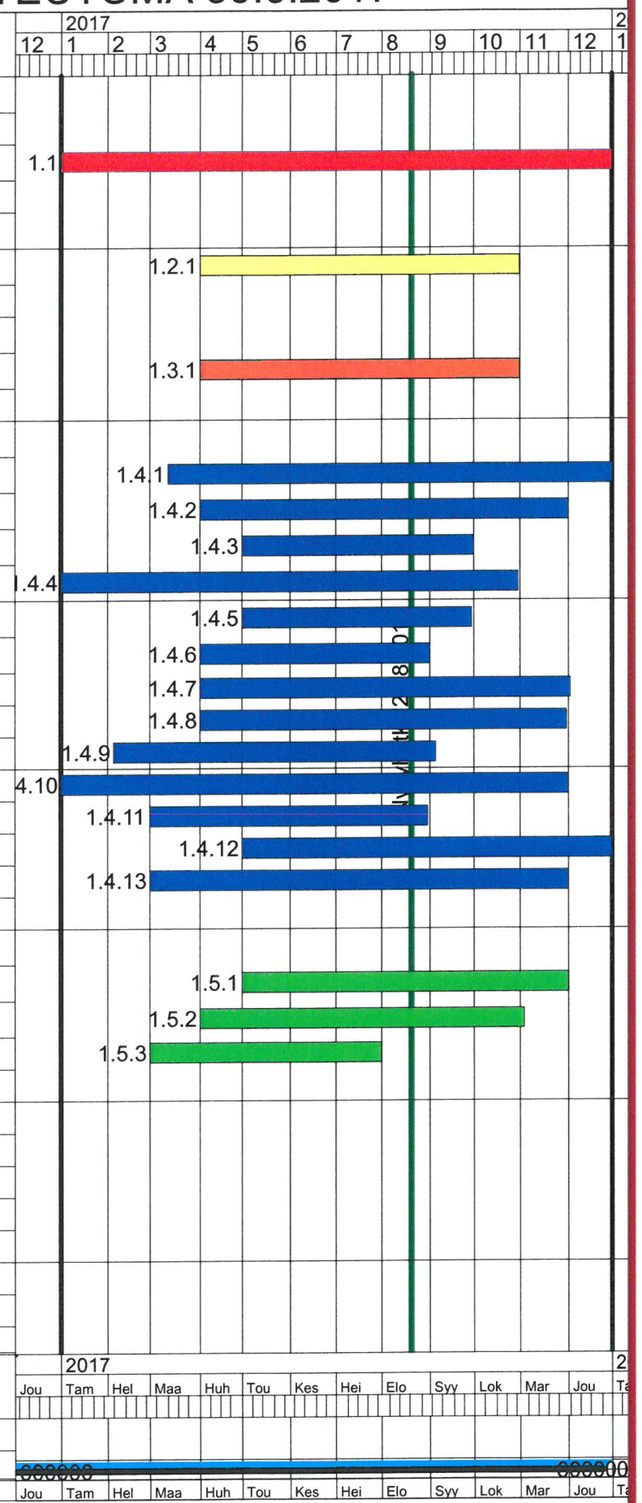

Kohde	Vuosi	Tyyli	Viivatyyli
Menot kuukausittain	Talousarvio 2017		

Janojen värit valittu siten, että kunkin pääryhmän sisällä janan väri on sama

21.8.2017

Laadittu:
Raision kaupunki

PlaNet 6.1
